

第二小学校等複合施設整備事業について

1 契約件名及び受注者

契約件名：立川市立第二小学校等複合施設整備事業
受注者：関東・長井特定建設工事共同企業体

2 これまでの経緯

令和7年1月	契約（基本設計着手）、事業説明会の開催
2月	市政アドバイザー（建築計画）への意見聴取
7月	仮設校舎建設工事に関する説明会の開催
9月	PTA役員会への説明
10月	周辺地域との意見交換会
12月	基本設計とりまとめ
令和8年1月	実施設計着手
1月24日	校舎にありがとうプロジェクトの開催
1月30・31日	基本設計及び解体工事事前説明会の開催
3月2日	第二小の歴史と思い出を振り返るイベントの開催
3月7日	第二小の歴史と思い出を振り返るアンコールイベントの開催
3月23～30日	仮設校舎へ引越し
4月1日	仮設校舎供用開始
4月22日	既存校舎等解体工事着手

3 仮設校舎内の様子（令和8年4月10日）



4 第二小の歴史と思い出を振り返るイベントの状況（令和8年3月2日）



ドローンによる撮影の様子



くるりん・ウドラ・トコちゃんも参加

5 今後の予定

令和8年4月～	既存校舎等解体工事
9月	議会報告
12月頃	実施設計完了・新設校舎建設着手（着手前に実施設計及び工事説明会を10月頃開催予定）
令和10年12月	新校舎・新体育館へ引越し（冬休み）
令和11年1月～	新校舎・新体育館供用開始

6 その他報告事項

① 契約変更（契約金額の増額）について

- 施設整備請負契約 約款第25条（条件変更等）や第33条（賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更）に該当する内容（地中障害物の撤去処分、インフレスライド等）について、今後、事業者との協議が整い次第、契約金額の変更を行う予定がある。

② 卒業制作物等の保存について

- 引越しに伴い、旧校舎の卒業制作物等は整備基本計画策定時の検討に基づき、仮設校舎へ移設可能なものは移設し、一時保管としたものは移設した。今後、新校舎へ再設置するかどうかを検討していく。




校歌銘板を仮設校舎に移設（平成元年卒業制作物）



タイムカプセル掘出し（平成2年度設置）

③ 立川警察署等による災害対処訓練について

- 解体する旧校舎を活用して、立川警察署等が「災害に強い街づくり」を目指し、令和8年4月22日から24日にかけて災害対処訓練を実施した。

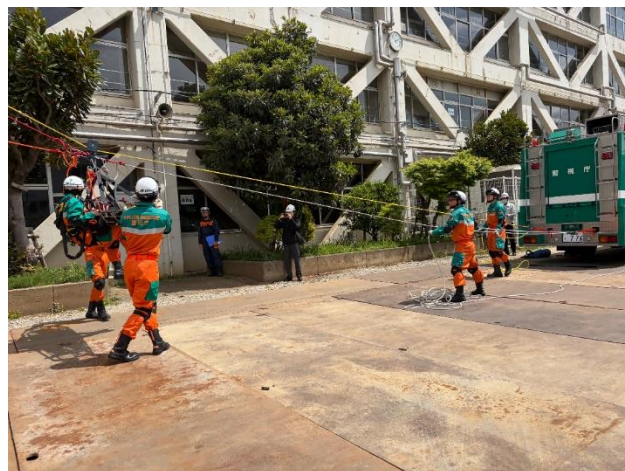

救助訓練風景（4月22日）
